

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros lineales	1021.8	1021.8	<a href="#">Editar</a>	<a href="#">Eliminar</a>


### Geolocalización

#### Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente( ▾ )

[Agregar georreferencia](#)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Guanajuato	Jerécuaro	Purísima De La Barranca (Rancho Nuevo)	RANCHERIA PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO), 38555 PURÍSIMA DE LA BARRANCA (RANCHO NUEVO), JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PURÍSIMA DE LA BARRANCA-CANDELAS Y CAMINO CANDELAS, LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SE CONECTARÁ DE	20.33999104/-100.46172834	<a href="#">Eliminar</a>

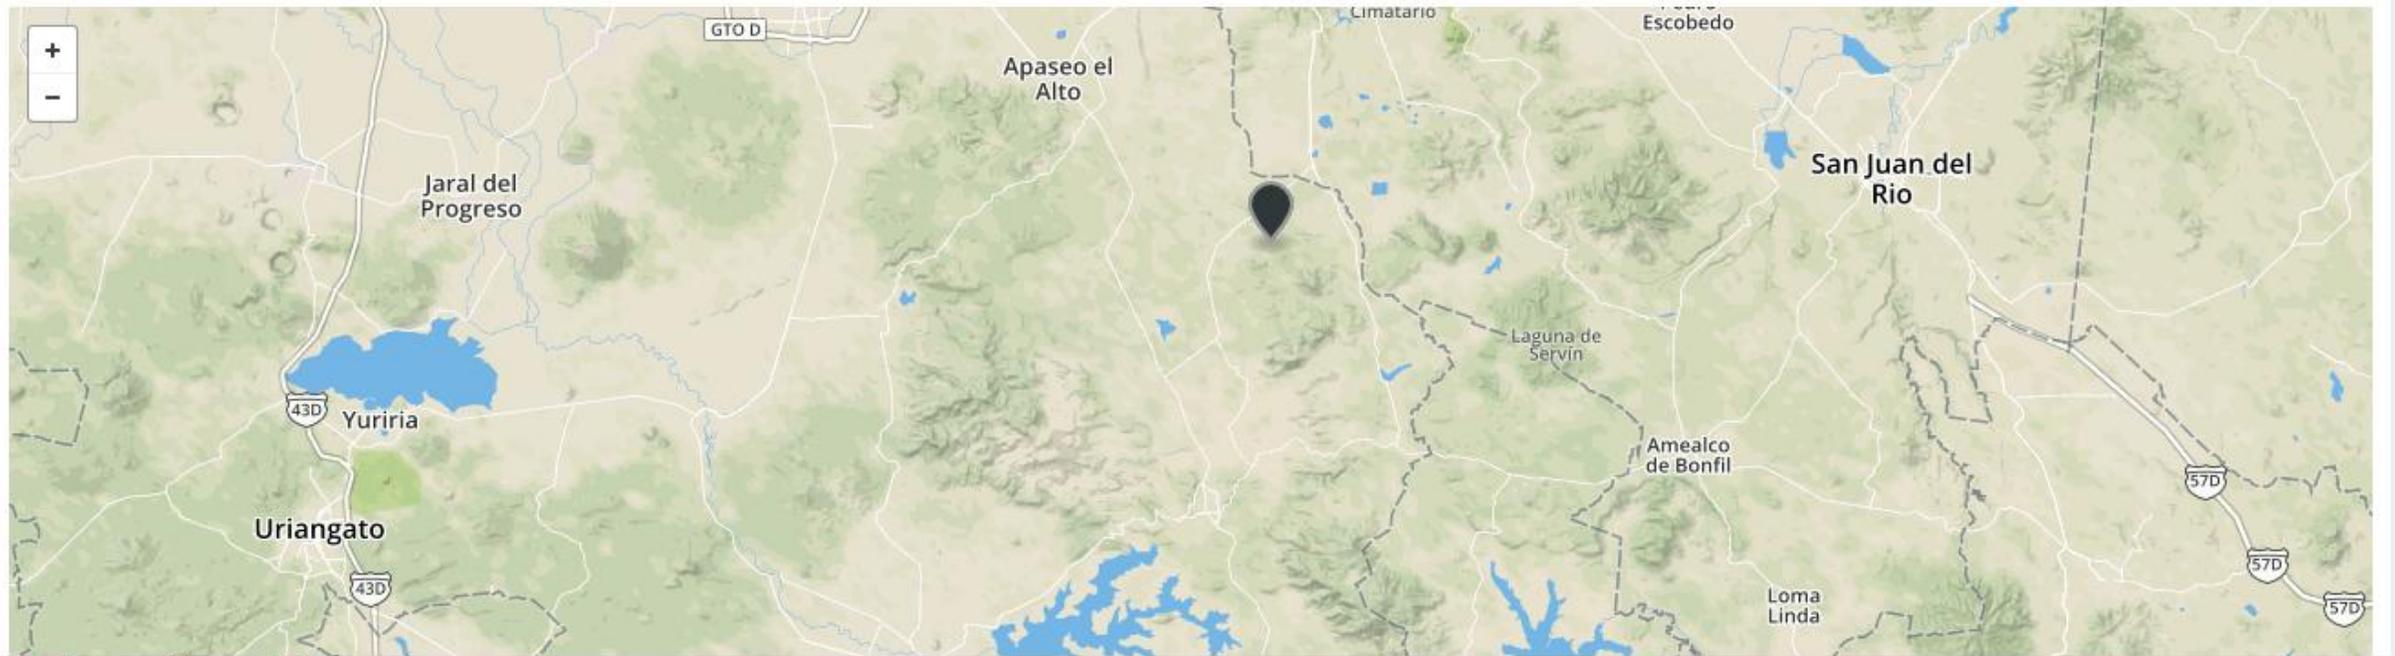

Tipo de Recurso	Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$471,085.51	\$471,08	Eliminar

### Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2019 / ABR-JUN	\$133,083.01	\$133,083.01	\$133,083.01	\$133,083.01	\$133,083.01	28.250288%	Editar

### Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **30.00 %**

**Unidad de Medida:** 
**Meta:** 
**Meta Modificada:**  
 Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **30.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2019 ABR-JUN	306.54	30%	Editar

# Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



## Información de obra por contrato o administración directa

🔍 Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	OPJ/R33-FI/19-07	MANUEL GONZALEZ PEREZ	MUNICIPIO DE JERECUARO GTO	\$443,610.05	\$443,610.05	<a href="#">Ver detalles</a>	<a href="#">Eliminar</a>

✖ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →



Eliminar

Desarrollo



Eliminar

✕ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →



## Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



### ¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO  
**GUA190201548566**

✕ Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >



La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.



⊕ Aceptar


## Registros de Avances

Registros de Avances Individual de Proyectos



### ¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO  
**GUA190201548566**

✕ Cancelar

← Anterior

⌚ Procesando...
